

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA DE
TIZIMÍN
LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE
SOFTWARE**

**“PLAN DE GESTIÓN Y CONFIGURACIÓN
DE CAMBIOS”**

UNIDAD 4 ADA 2

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS I

**JORGE ARMANDO CANCHE TINTORE
BRYAN EMMANUEL CETZAL CEME
LUIS MANUEL LAGUNEZ RODRÍGUEZ
LETICIA DEL CARMEN TEJERO
GAMBOA**

**DR. SERGIO ALEJANDRO GONZÁLEZ
SEGURA**

13 DE MAYO DE 2025

PLAN DE GESTIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CAMBIOS

Proyecto: **Pet's Ride**

Versión: **1.0**

Fecha: **13/05/2025**

Contenido

Introducción	4
Gestión de la configuración.....	4
1. Aspectos organizacionales y legales.	4
2. Organigrama y responsabilidades.....	4
3. Flujo de trabajo y procedimientos.	5
4. Control de calidad.	5
Descripción de actividades	5
1. Identificación de ítems.	5
2. Gestión de cambios.....	5
3. Gestión de entregas.....	6
4. Auditorías: base de datos de la configuración.....	6
Planificación temporal.....	6
Recursos: humanos, físicos y herramientas	6
Mantenimiento y actualización del plan (medidas).....	7

Introducción


El presente documento describe el plan de gestión de configuración y cambios del proyecto *Pet's Ride*, una plataforma tecnológica que conecta a dueños de mascotas con servicios como transporte, hospedaje, veterinarios y cuidadores. Este plan tiene como objetivo establecer los procedimientos, herramientas y recursos necesarios para controlar y asegurar la integridad de los elementos del proyecto a lo largo de su ciclo de vida, así como la correcta gestión de los cambios que puedan surgir.

Gestión de la configuración

1. Aspectos organizacionales y legales.

La gestión de configuración del proyecto se alinea con las normativas legales aplicables en México relacionadas con la protección de datos (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares), propiedad intelectual y derechos de Software. A nivel organizacional, se seguirá el estándar ISO/IEC 12207 para procesos de desarrollo de software.

2. Organigrama y responsabilidades.

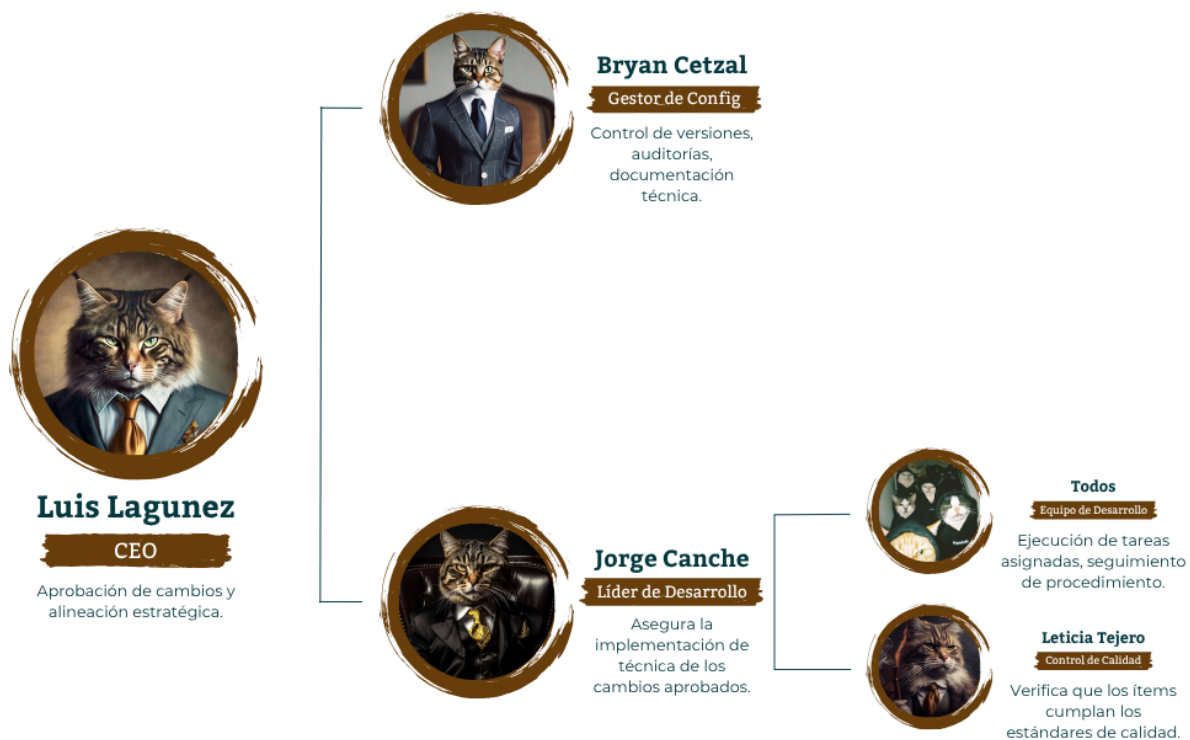

3. Flujo de trabajo y procedimientos.

- 1) Solicitud de cambio (usuario, desarrollador, stakeholder).
- 2) Evaluación de impacto por el Gestor de Configuración.
- 3) Aprobación o rechazo por el comité de cambios.
- 4) Implementación por el equipo técnico.
- 5) Verificación por QA.
- 6) Actualización de ítems y documentación.
- 7) Registro en la base de datos de la configuración.

4. Control de calidad.

- Revisión de código (peer review).
- Validación de versiones en entorno de pruebas.
- Pruebas automatizadas y manuales.
- Cumplimiento de criterios de aceptación definidos por el Product Owner.
- Control de versiones en Git (con políticas de “merge request”).

Descripción de actividades

1. Identificación de ítems.

Los ítems de configuración incluyen:

- Código fuente.
- Base de datos y scripts.
- Documentación técnica y de usuario.
- Archivos de diseño UX/UI.
- Librerías externas.
- Artefactos de despliegue (APK, instaladores).

Cada ítem será versionado y registrado con un identificados único y metadatos (versión, autor, fecha, descripción).

2. Gestión de cambios.

- Registro de solicitudes en un sistema de seguimiento (Jira).
- Clasificación de cambios: correctivos, adaptativos, perfectivos o evolutivos.
- Evaluación de impacto en tiempo, costo, calidad y recursos.
- Planificación de la implementación y pruebas de validación.
- Registro de decisiones y actualizaciones en la base de configuración.

3. Gestión de entregas.

- Planificación de entregas por sprints (cada 2 semanas).
- Verificación del cumplimiento de criterios de entrega.
- Documentación de cada versión liberada (release notes).
- Control de versiones y backup en repositorio (GitHub).

4. Auditorías: base de datos de la configuración.

- Auditorías periódicas para asegurar coherencia entre la documentación, los entregables y el sistema de control de versiones.
- Revisión de trazabilidad de los cambios implementados.
- Reportes de auditoría entregados al CEO y comité de calidad.

Planificación temporal

Actividad	Frecuencia/Fecha
Revisión de ítems	Semanal
Evaluación de cambios	Bajo demanda
Implementación de cambios	Durante los sprints
Auditoría de configuración	Cada fin de sprint
Actualización del plan	Trimestral o según necesidad

Recursos: humanos, físicos y herramientas

Humanos:

- 1 gestor de Configuración.
- 1 líder de Desarrollo.
- 3 desarrolladores.
- 1 QA.

Físicos:

- Computadoras con entornos de desarrollo.
- Servidores de pruebas y producción.

Herramientas:

- Git (control de versiones).
- GitHub (repositorio, gestión de issues).
- Jira (gestión de tareas y cambios).
- Astah (modelado de arquitectura y procesos).
- Google Drive (documentación).

- GitHub Actions (automatización de despliegues).

Mantenimiento y actualización del plan (medidas)

El plan será revisado al final de cada trimestre o ante cambios significativos en el equipo, los procesos o el alcance del proyecto. Las actualizaciones serán realizadas por el Gestor de Configuración y validadas por el CEO y el Comité de Cambios.

Medidas:

- Retroalimentación del equipo después de cada sprint.
- Indicadores de calidad (número de errores detectados, cumplimientos de entrega).
- Encuestas internas de satisfacción con el proceso de cambios.
