

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA DE
TIZIMÍN
LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE
SOFTWARE**

**“PLAN DE GESTIÓN DE COSTES Y
LÍNEA BASE DE COSTES”**

UNIDAD 3 ADA 5

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS I

**JORGE ARMANDO CANCHE TINTORE
BRYAN EMMANUEL CETZAL CEME
LUIS MANUEL LAGUNEZ RODRÍGUEZ
LETICIA DEL CARMEN TEJERO
GAMBOA**

**SERGIO ALEJANDRO GONZÁLEZ
SEGURA**

06 DE MAYO DE 2025

Contenido

1.	Introducción.....	3
2.	Procesos de Gestión de Costos	3
2.1	Planificar la Gestión de los Costos.....	3
2.2	Estimar los Costos	3
2.3	Determinar el Presupuesto.....	4
2.4	Controlar los costos.....	4
3.	Roles y Responsabilidades	4
4.	Formato de Reportes	4
5.	Línea Base de Costos del Proyecto	5

1. Introducción

El presente documento describe cómo se gestionarán los costos del proyecto *Pet's Ride*, una aplicación que brinda servicios integrales para mascotas. El objetivo es asegurar que los recursos económicos se utilicen eficientemente y que el proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado.

2. Procesos de Gestión de Costos

2.1 Planificar la Gestión de los Costos

- **Responsable:** Gerente de Proyecto (Luis Manuel Lagunez Rodríguez)
- **Enfoque:** Se utilizará un enfoque híbrido, combinando estimaciones ascendentes y paramétricas.
- **Herramientas:** Hojas de cálculo, software de gestión de proyectos (Jira) y control financiero.
- **Medida de desempeño:** Se utilizará el análisis del valor ganado (EVM) para comparar el costo planificado vs el real.
- **Frecuencia de revisión:** Cada 15 días o cuando se presente una desviación superior al 10%.

2.2 Estimar los Costos

Componentes	Tipo de costo	Estimación (MXN)	Técnica usada
Diseño UX/UI	Personal interno	\$80,000.00	Estimación análoga
Desarrollo Backend y API	Personal interno	\$150,000.00	Estimación ascendente
Desarrollo Frontend	Personal interno	\$100,000.00	Estimación ascendente
Infraestructura en la nube	Recurrente mensual	\$20,000.00/mes	Estimación paramétrica
Marketing inicial	Personal interno	\$30,000.00	Estimación análoga
Seguridad y cumplimiento	Personal interno	\$90,000.00	Estimación ascendente
Pruebas y aseguramiento de la calidad	Personal interno	\$70,000.00	Estimación ascendente
Infraestructura y HW	Recurrente mensual	\$15,000.00/mes	Estimación paramétrica
Legal y cumplimiento normativo	Fijo	\$10,000.00	Estimación basada en expertos
Mantenimiento	Personal interno	\$10,000.00	Estimación ascendente
Otros (reserva de contingencia)	Reserva	\$64,000.00	Análisis de reserva

2.3 Determinar el Presupuesto

- **Línea base del costo:** \$750,000.00
- **Reserva de gestión:** 10% adicional del presupuesto (\$75,000.00 MXN) para riesgos imprevistos no incluidos en la línea base.
- **Total del presupuesto aprobado:** \$825,000.00

2.4 Controlar los costos

- **Método:** Comparación entre el valor ganado (EV), el costo real (AC) y el valor planificado (PV).
- **Indicadores clave:**
 - **CPI (Índice de desempeño de costos):** EV/AC
 - **SPI (Índice de desempeño de cronograma):** EV / PV
- **Herramientas:** Reportes quincenales, hojas de cálculo de costos y reuniones de revisión de avance.
- **Acciones correctivas:** Si el CPI < 0.9 o si el gasto quincenal supera el 110% del plan, se detienen nuevos compromisos y se revisa el alcance o el cronograma.

3. Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidad
Gerente de Proyecto	Aprobar y controlar costos
Responsable de Desarrollo	Reportar gastos técnicos
Responsable de Marketing	Planificar y justificar inversión publicitaria
Contador/Finanzas	Emitir reportes financieros mensuales


4. Formato de Reportes

Se usará un dashboard quincenal con:

- Gastos acumulados vs planeados.
- Alertar de desviación.
- KPI de CPI y SPI.
- Gráfica de línea base vs real.

5. Línea Base de Costos del Proyecto

Mes	Costo mensual (MXN)	Costo acumulado (MXN)
Mes 1	\$210,833.00	\$210,833.00
Mes 2	\$170,833.00	\$381,666.00
Mes 3	\$170,833.00	\$552,499.00
Mes 4	\$117,500.00	\$669,999.00
Mes 5	\$35,000.00	\$704,999.00
Mes 6	\$45,000.00	\$749,999.00

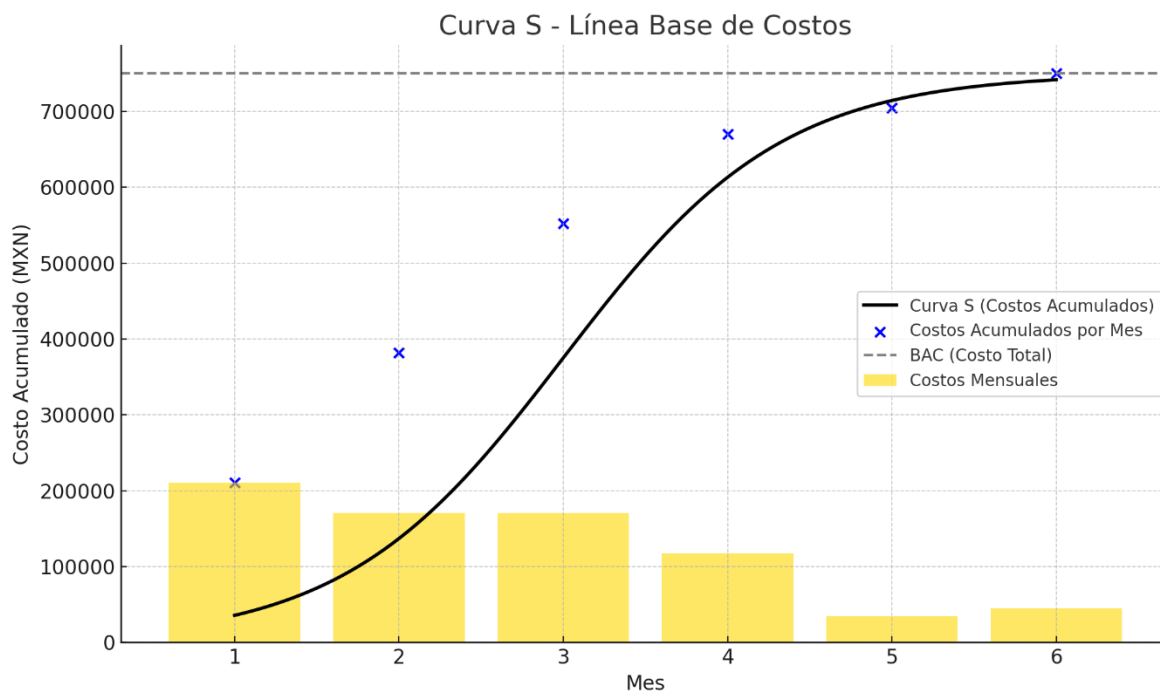

- **Barras doradas:** el gasto mensual.
- **Puntos azules:** el costo acumulado mes a mes.
- **Línea negra:** la curva S suavizada.
- **Línea gris discontinua:** el costo total del proyecto.
