


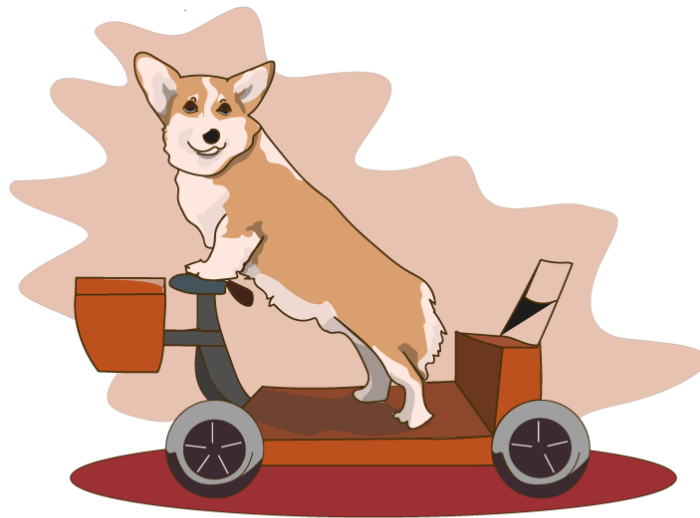

PET'S RIDE

Plan de Aceptación para el proyecto:

Pet's Ride

Elaborado por:

Canche Tintore Jorge Armando
Cetzal Ceme Bryan Emmanuel
Lagunez Rodríguez Luis Manuel
Tejero Gamboa Leticia del Carmen
Turriza Euan Andrés de Jesús

Versión: 1.1

Fecha: **25 de noviembre de 2025**

Plan de Aceptación

Tabla de Contenido

1. Introducción	4
1.1 Propósito	4
1.2 Alcance.....	4
2. Objetivo del Proceso de Aceptación	5
3. Roles y Responsabilidades	5
4. Proceso de Aceptación	6
4.1 Revisión y Validación de Requisitos	6
4.2 Preparación del Entorno de Pruebas.....	6
4.3 Ejecución de Pruebas de Aceptación	6
4.4 Registro de Resultados y Evidencias	7
4.5 Corrección de Defectos y Retrabajos.....	7
4.6 Elaboración del Informe Final de Aceptación	7
4.7 Aprobación Formal del Producto	7
5. Criterios de Aceptación.....	8
5.1 Criterios Generales	8
5.2 Criterios Funcionales.....	8
5.3 Criterios No Funcionales.....	9
5.4 Criterios Técnicos	9
5.5 Criterios Documentales.....	10
5.6 Criterios de Aceptación Final	10
6. Entregables del Proceso de Aceptación.....	10
6.1 Plan de Pruebas de Aceptación (UAT).....	10
6.2 Casos de Prueba y Escenarios de Validación.....	11
6.3 Bitácora de Ejecución y Resultados de Prueba	11

6.4	Bitácora de Defectos	11
6.5	Evidencias de Pruebas	11
6.6	Informe Final de Pruebas de Aceptación	12
6.7	Acta o Documento de Aprobación de Aceptación	12
6.8	Documentación Complementaria.....	12
7.	Riesgos Asociados.....	13
7.1	Riesgos Operativos	13
7.2	Riesgos Técnicos.....	13
7.3	Riesgos de Gestión y Comunicación	14
7.4	Riesgos de Infraestructura	15
7.5	Riesgos de Usuario Final.....	15
7.6	Evaluación Continua de Riesgos	15
8.	Cronograma	16
8.1	Estructura del Cronograma	16
8.2	Cronograma Tentativo del Proceso	16
8.3	Consideraciones del Cronograma	17
8.4	Representación Visual	18
9.	Aprobaciones	19
9.1	Responsables de Aprobación	19
9.2	Proceso de Formalización	19
9.3	Criterios para Aprobar el Proyecto.....	20

Plan de Aceptación para el Proyecto Pet's Ride

1. Introducción

La aceptación de producto es una fase crítica dentro del ciclo de vida del proyecto *Pet's Ride*, ya que permite asegurar que los entregables cumplen con las expectativas, características y requisitos previamente establecidos. Este documento establece el proceso, criterios, roles y alineamientos necesarios para verificar formalmente que las funcionalidades y componentes desarrollados se encuentran listos para su implementación en producción o su entrega final al cliente.

La presente guía proporciona una estructura clara para garantizar que las validaciones de los usuarios, el análisis funcional, las pruebas técnicas y las revisiones finales se realicen de manera consistente y documentada. Al formalizar el proceso de aceptación, se busca minimizar los riesgos asociados con entregas incompletas, inconsistencias técnicas y problemas operativos posteriores.

1.1 Propósito

El propósito del Plan de Aceptación es definir de forma estandarizada cómo se evaluarán los entregables del proyecto *Pets's Ride* para determinar su conformidad con los requisitos funcionales, no funcionales y de calidad establecidos.

Este plan detalla los procedimientos, criterios y métricas que se emplearán para validar el correcto funcionamiento de la solución, asegurando que los usuarios finales cuenten con una plataforma confiable, segura y eficiente para la gestión y solicitud de servicios de transporte para mascotas.

Asimismo, el documento sirve como referencia tanto para el equipo técnico como para los responsables de negocio, facilitando la comunicación, la trazabilidad y la toma de decisiones sobre la aprobación o rechazo de los componentes desarrollados.

1.2 Alcance

El alcance de este Plan de Aceptación comprende todas las actividades relacionadas con la validación, verificación y aprobación de los elementos que conforman la solución *Pets's Ride*.

Esto incluye tanto las funcionalidades principales como el registro de usuarios, solicitud de traslados, asignación de transportistas, seguimiento del viaje y sistema de pagos así como los módulos complementarios, integraciones, interfaces y documentación asociada.

El plan cubre las pruebas de aceptación realizadas por usuarios clave, revisiones funcionales por parte del equipo de producto y revisiones técnicas por parte del equipo de calidad. No abarca actividades de desarrollo, diseño detallado o pruebas unitarias, ya que estas forman parte de otros procesos dentro del ciclo del proyecto.

Plan de Aceptación para el Proyecto Pet's Ride

Adicionalmente, se incluyen las condiciones de aceptación del entorno, la disponibilidad de recursos, los lineamientos de aprobación formal y las restricciones que pudieran influir en el proceso.

2. Objetivo del Proceso de Aceptación

El proceso de aceptación tiene como objetivo asegurar que los productos y funcionalidades entregados en el proyecto *Pets's Ride* cumplen plenamente con las necesidades del negocio, la experiencia esperada por los usuarios finales y los requisitos técnicos definidos al inicio del proyecto.

A través de un conjunto ordenado de actividades, se busca:

- **Garantizar la conformidad** con los requisitos funcionales definidos en historias de usuario, especificaciones o documentación técnica.
- **Validar la calidad del producto**, asegurando que éste sea estable, seguro y adecuado para su uso operativo.
- **Asegurar la satisfacción del cliente y usuarios clave**, quienes verifican que la solución cumple sus expectativas en términos de usabilidad, rendimiento y coherencia funcional.
- **Identificar y gestionar defectos** detectados durante las pruebas de aceptación, asegurando su corrección antes de la liberación productiva.
- **Disminuir riesgos operativos y técnicos**, mediante una validación exhaustiva que anticipe posibles fallas en producción.

En conjunto, estos objetivos permiten que las decisiones de aprobación se tomen sobre bases sólidas y verificadas, fortaleciendo la fiabilidad de la solución final.

3. Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidades
Product Owner / Cliente	Aprobar entregables, definir criterios de aceptación, validar pruebas.
Líder de QA	Definir planes de prueba, coordinar ejecución, evidencia.
Equipo de Desarrollo	Atender defectos, ajustar funcionalidades, entregar evidencias técnicas.
Usuarios Finales / Beta Tester	Probar funcionalidad desde casos de uso reales.
Gerente de Proyecto	Coordinar actividades, asegurar cumplimiento del plan de aceptación.

Plan de Aceptación para el Proyecto Pet's Ride

4. Proceso de Aceptación

El proceso de aceptación establece las actividades necesarias para validar que los entregables del proyecto *Pets's Ride* cumplen con los requisitos funcionales, no funcionales y de calidad establecidos. Esta etapa asegura que la solución es apta para su puesta en operación y que los usuarios clave la consideran adecuada para satisfacer las necesidades del negocio.

El proceso se compone de diversas fases secuenciales e iterativas que involucran la preparación, ejecución, evaluación y aprobación formal de los productos desarrollados. Las actividades se detallan a continuación:

4.1 Revisión y Validación de Requisitos

Antes de iniciar las actividades de aceptación, se realiza una revisión formal de los requisitos funcionales, históricos de usuario, criterios de aceptación y especificaciones técnicas del proyecto.

El objetivo es asegurar que dichos requisitos estén claros, actualizados, trazables y alineados con las necesidades del negocio. Esta verificación permite garantizar que las pruebas evaluarán el comportamiento correcto del sistema y que no existan ambigüedades que afecten la validación del producto.

4.2 Preparación del Entorno de Pruebas

Se habilita un entorno controlado de pruebas de aceptación, independiente del entorno de desarrollo y producción, que permita realizar validaciones confiables y reproducibles.

Las actividades incluyen:

- Configuración técnica del entorno (aplicación, backend, base de datos, integraciones).
- Generación o carga de datos representativo del negocio.
- Establecimiento de usuarios, roles y permisos.
- Verificación del correcto funcionamiento inicial del entorno.

Este entorno deberá reflejar, en la medida de lo posible, las condiciones reales de operación de *Pet's Ride*, para garantizar que las validaciones sean precisas.

4.3 Ejecución de Pruebas de Aceptación

En esta fase, los usuarios clave, el equipo de QA y el Product Owner validan los flujos funcionales y no funcionales del sistema, siguiendo los casos de prueba, criterios de aceptación y escenarios previamente definidos.

La ejecución contempla:

- Pruebas funcionales de los flujos principales de la plataforma.

Plan de Aceptación para el Proyecto Pet's Ride

- Validación de reglas de negocio específicas (solicitud de transporte, asignación de transportista, seguimiento en tiempo real, pagos, notificaciones).
- Pruebas de usabilidad, coherencia visual y navegación.
- Validación básica de desempeño y estabilidad.
- Pruebas de regresión cuando se presenten ajustes o correcciones.

El objetivo es garantizar que la solución es estable, completa y coherente con lo esperado por el negocio.

4.4 Registro de Resultados y Evidencias

Durante la ejecución, cada caso de prueba se documenta indicando su resultado (aprobado, rechazado o con observaciones). Se recopilan evidencias como capturas de pantalla, videos, registros del sistema y notas que respalden los hallazgos detectados. Asimismo, se documentan los defectos, clasificándolos según su severidad (crítico, alto, medio, bajo) y su impacto sobre el sistema.

Toda esta información se concentra en una bitácora o reporte de prueba, que servirá como insumo para la toma de decisiones finales.

4.5 Corrección de Defectos y Retrabajos

Los defectos identificados son atendidos por el equipo de desarrollo según su prioridad.

Posteriormente, el equipo de QA coordina la ejecución de pruebas de verificación (retest) y, si corresponde, pruebas de regresión para confirmar que las correcciones no generaron comportamientos inesperados.

Esta etapa puede repetirse de manera iterativa hasta alcanzar el nivel de calidad requerido.

4.6 Elaboración del Informe Final de Aceptación

Una vez concluidas las pruebas de verificación, el equipo de QA genera un informe final que resume:

- Resultados obtenidos.
- Defectos abiertos y su justificación (si los hubiera).
- Nivel de cumplimiento respecto a los criterios establecidos.
- Recomendación sobre la aprobación o no del entregable.

Este informe constituye la evaluación formal que respalda la decisión final del Product Owner o cliente.

4.7 Aprobación Formal del Producto

Finalmente, el Product Owner, cliente o autoridad correspondiente revisa el informe final y determina si el producto cumple con los criterios necesarios para su aceptación.

Plan de Aceptación para el Proyecto Pet's Ride

La aprobación se documenta mediante un acta, firma electrónica o medio equivalente, lo que formaliza la aceptación del entregable y autoriza su implementación en producción o su liberación oficial.

5. Criterios de Aceptación

Los criterios de aceptación establecen las condiciones mínimas que los entregables del proyecto *Pets's Ride* deben cumplir para ser considerados completos y aptos para su implementación. Estos criterios se derivan de los requisitos funcionales, no funcionales, técnicos y documentales definidos en el alcance del proyecto. Su cumplimiento garantiza que la solución sea funcional, estable, segura y coherente con las necesidades del negocio y de los usuarios finales.

Los criterios se dividen en categorías para facilitar su evaluación y trazabilidad.

5.1 Criterios Generales

- Todas las funcionalidades definidas como obligatorias en los requisitos o historias de usuario están implementadas y operativas.
- No existen defectos clasificados como **críticos** o **altos** que impidan la operación normal del sistema o comprometan la seguridad o estabilidad del servicio.
- El sistema permite realizar sin interrupciones los flujos principales de la plataforma, incluyendo:
 - Registro y autenticación de usuario.
 - Solicitud y programación de traslados.
 - Asignación o manual de transportistas.
 - Procesamiento de pagos y generación de comprobante.
- La experiencia general del usuario es consistente y no presenta errores que dificulten la navegación, visualización o comprensión de las funciones.
- Todos los entregables cumplen con los lineamientos de diseño, usabilidad y coherencia definidos para *Pet's Ride*.

5.2 Criterios Funcionales

Las funcionalidades deben cumplir completamente con:

- Las reglas de negocio documentadas.
- Los escenarios de uso definidos.
- Los criterios de aceptación de cada historia de usuario o requisito funcional.

Entre los criterios clave:

- Las validaciones de campos funcionan correctamente en todas las plantillas.
- El sistema reacciona adecuadamente a condiciones de error (datos incorrectos, falta de conexión, acciones no permitidas).

Plan de Aceptación para el Proyecto Pet's Ride

- Se reflejan estados precisos del viaje (pendiente, en curso, completado, cancelado).
- Las notificaciones push o correos electrónicos se envían en los momentos establecidos (confirmación, asignación, finalización de servicio).

5.3 Criterios No Funcionales

El sistema debe cumplir con parámetros mínimos de rendimiento, seguridad y disponibilidad:

Desempeño

- Los tiempos de carga no exceden los valores establecidos (3 segundos para carga inicial de pantalla y 2 segundo para transiciones).
- El sistema soporta el volumen esperado de transacciones sin degradación perceptible.

Seguridad

- Autenticación implementada según estándares definidos.
- Cifrado en tránsito mediante HTTPS.
- Roles y permisos aplicados adecuadamente para cada tipo de usuario (dueño, prestado).
- No deben existir vulnerabilidades evidentes relacionadas con la exposición de información o malas prácticas.

Usabilidad

- Interfaz intuitiva y consistente con los lineamientos de diseño.
- Navegación fluida y sin elementos confusos para el usuario.
- Textos, botones y mensajes claros y comprensibles.

Compatibilidad

- Correctitud visual y funcional en dispositivos y navegadores definidos en el alcance.
- Adaptación responsiva en plataforma web cuando aplique.

5.4 Criterios Técnicos

- La API y los servicios backend responden conforme a los contratos definidos (endpoints, parámetros, código de respuesta).
- Las integraciones con servicios externos (pagos, mapas, autenticación) funcionan correctamente bajo los escenarios previstos.
- No se presentan fugas de memoria ni errores críticos con logs.
- La base de datos refleja de manera consistente los estados de las operaciones realizadas.

Plan de Aceptación para el Proyecto Pet's Ride

5.5 Criterios Documentales

El proyecto se considera aceptable solo cuando la documentación complementaria esté completa, incluyendo:

- Manual de usuario para clientes y transportistas.
- Manual técnico para soporte o mantenimiento.
- Documentación de la API en versión final.
- Instructivos operativos, listas de verificación o guías para el uso interno del sistema.
- Registro completo de pruebas, bitácora de defectos y evidencias aprobadas.

5.6 Criterios de Aceptación Final

Para la liberación final del producto, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- Aprobación formal del informe final de pruebas por parte del equipo de QA.
- Firma o aprobación digital del Product Owner/cliente.
- Todos los requisitos obligatorios cumplidos y validados.
- Defectos menores aceptados documentados, con plan de corrección si aplica.
- Confirmación de que la solución está lista para uso operativo sin riesgo significativo.

6. Entregables del Proceso de Aceptación

Los entregables del proceso de aceptación representan el conjunto de documentos, evidencias y artefactos generados durante la validación del producto, los cuales permiten demostrar de manera objetiva el cumplimiento de los requisitos y la calidad de los componentes entregados en el proyecto *Pet's Ride*.

Estos entregables aseguran trazabilidad, documentan los resultados obtenidos y respaldan la decisión final de aprobación por parte del cliente o Product Owner.

A continuación, se detallan los entregables obligatorios del proceso:

6.1 Plan de Pruebas de Aceptación (UAT)

Documento que describe el alcance, enfoque, casos de uso, escenarios y criterios que serán evaluados durante las pruebas de aceptación. Incluye:

- Objetivos de la prueba.
- Estrategia general.
- Matriz de requisitos vs. Casos de pruebas.
- Datos requeridos.
- Cronograma y responsables.

Este plan guía todas las actividades previas y posteriores a la ejecución de la prueba.

Plan de Aceptación para el Proyecto Pet's Ride

6.2 Casos de Prueba y Escenarios de Validación

Conjunto de casos de prueba estructurados que describen detalladamente los pasos, condiciones iniciales, datos de entrada y resultado esperados para validar cada funcionalidad.

Incluye:

- Casos de prueba funcionales.
- Casos de prueba no funcionales (básicos).
- Escenarios negativos y alternos.
- Scripts automáticos.

Estos documentos garantizan que las validaciones se realicen de forma ordenada y replicable.

6.3 Bitácora de Ejecución y Resultados de Prueba

Registro completo de los resultados obtenidos durante la ejecución de las pruebas, con estatus por cada caso de prueba:

- Aprobado.
- Rechazado.
- Aprobado con observaciones.

Esta bitácora también contiene las evidencias asociadas (capturas, videos, logs), así como observaciones que contextualizan los hallazgos encontrados.

6.4 Bitácora de Defectos

Documento o herramienta donde se registran todos los defectos detectados durante la fase de aceptación incluyendo:

- Descripción del defecto.
- Severidad e impacto.
- Prioridad asignada.
- Evidencias asociadas.
- Estado (abierto, en proceso, verificado, cerrado).
- Responsable de resolución.
- Fecha de reporte y fecha de cierre.

Este entregable facilita el seguimiento y cierre adecuado de los incidentes.

6.5 Evidencias de Pruebas

Compendio de capturas de pantalla, grabaciones de sesión, logs del sistema, mensajes de error, resultados de consultas o cualquier elemento que respalde objetivamente el comportamiento observado durante la validación.

Plan de Aceptación para el Proyecto Pet's Ride

Estas evidencias complementan la trazabilidad entre requisitos, casos de prueba y resultados obtenidos.

6.6 Informe Final de Pruebas de Aceptación

Documento formal elaborado por el equipo de QA o responsable de validación que contiene:

- Resumen ejecutivo.
- Métricas de ejecución (total de casos probados, aprobados, rechazados, porcentaje de cumplimiento).
- Riesgos o restricciones detectadas.
- Defectos abiertos y su justificación.
- Conclusiones sobre el nivel de calidad del producto.
- Recomendación sobre la aprobación del entregable.

Este informe sirve como base para la decisión final de aceptación.

6.7 Acta o Documento de Aprobación de Aceptación

Documento firmado por el Product Owner, cliente o autoridad correspondiente, mediante el cual se formaliza la aceptación del producto o módulo evaluado.

Incluye:

- Identificación del entregable aprobado.
- Fecha de aceptación.
- Condiciones o excepciones (si existen).
- Validación explícita de que el producto está listo para su puesta en operación.

La firma de este documento constituye el cierre formal del proceso de aceptación.

6.8 Documentación Complementaria

Dependiendo del alcance, pueden entregarse materiales adicionales que aseguran la operatividad del sistema:

- Manual de usuario.
- Manual técnico y de soporte.
- Documentación actualizada de la API.
- Procedimientos operativos y listas de verificación.
- Capacitación o material de formación (si aplica).

Plan de Aceptación para el Proyecto Pet's Ride

7. Riesgos Asociados

El proceso de aceptación del proyecto *Pets's Ride* puede verse afectado por diversos riesgos que impactan la calidad de los resultados, los tiempos de validación y la decisión final de aprobación del producto. La identificación oportuna de estos riesgos permite establecer medidas preventivas y correctivas que aseguren el cumplimiento del cronograma y la calidad esperada de los entregables.

A continuación, se describen los principales riesgos asociados al proceso, así como sus posibles impactos y estrategias de mitigación.

7.1 Riesgos Operativos

Disponibilidad limitada de usuarios clave para la UAT

Descripción: Los usuarios finales o testers pueden no estar disponibles para ejecutar las pruebas en los tiempos previstos.

Impacto: Retrasos en el proceso de aceptación y riesgo de validaciones incompletas.

Mitigación:

- Coordinar agendas con anticipación.
- Asegurar reemplazos o suplentes capacitados.
- Establecer periodos específicos obligatorios de participación.

Cambios de requerimientos durante el proceso de aceptación

Descripción: Solicitudes de cambio o ajustes no planificados durante la fase de validación.

Impacto: Reprocesos, desviación en tiempos y posibles inconsistencias en pruebas.

Mitigación:

- Control formal de cambios.
- Revisión y aprobación estricta por parte del Product Owner.
- Ajuste del cronograma cuando sea necesario.

7.2 Riesgos Técnicos

Defectos críticos o mayor cantidad de fallos de lo esperado

Descripción: Aparición de errores críticos que afectan los flujos principales del sistema.

Impacto: Retrasos en el proceso, necesidad de retrabajo intensivo y pérdida de confianza del cliente.

Mitigación:

- Ciclos previos de pruebas internas exhaustivas.

Plan de Aceptación para el Proyecto Pet's Ride

- Pruebas de humo antes de iniciar la UAT.
- Implementar controles de calidad continuos durante el desarrollo.

Fallas en servicios externos o integraciones

Descripción: Interrupciones o comportamientos inconsistentes en servicios de terceros (pagos, mapas, autenticación, etc.).

Impacto: Impide validar funcionalidades completas y afecta el resultado de las pruebas.

Mitigación:

- Simulación o ambientes sandbox para pruebas.
- Monitoreo constante de integraciones.
- Protocolos alternos en caso de fallas.

Inconsistencias en datos utilizados para pruebas

Descripción: Datos incompletos, duplicados o inválidos en el entorno UAT afectando los resultados.

Impacto: Resultados erróneos o no representativos.

Mitigación:

- Preparar y depurar antes de iniciar la etapa de aceptación.
- Automatizar la carga de datos de prueba.
- Mantener respaldo y restauración rápida.

7.3 Riesgos de Gestión y Comunicación

Falta de claridad en los criterios de aceptación

Descripción: Los criterios no están completamente definidos o ambiguos.

Impacto: Pruebas subjetivas, decisiones inconsistentes o rechazo injustificado de funcionalidades.

Mitigación:

- Alineación previa entre QA y desarrollo.
- Validación y aprobación formal de criterios antes del inicio de la UAT.

Retraso en la atención o corrección de defectos

Descripción: El equipo técnico no resuelve los defectos dentro del tiempo previsto.

Impacto: Extensión del periodo de pruebas y atraso en la liberación del producto.

Plan de Aceptación para el Proyecto Pet's Ride

Mitigación:

- Establecer prioridades claras.
- Asignar recursos adicionales en caso necesario.
- Seguimiento diario con responsables.

7.4 Riesgos de Infraestructura

Fallas en el entorno UAT

Descripción: Problemas de disponibilidad, configuraciones incorrectas o baja estabilidad del entorno de pruebas.

Impacto: Interrupciones en las pruebas y retrasos en la aceptación.

Mitigación:

- Validación previa del entorno.
- Monitoreo técnico durante la ejecución.
- Procedimiento de recuperación o reiniciado rápido.

7.5 Riesgos de Usuario Final

Errores derivados de desconocimiento o falta de capacitación

Descripción: Los usuarios evaluadores no comprenden completamente los flujos o funcionalidades.

Impacto: Falsos defectos, confusión o rechazo erróneo de la solución.

Mitigación:

- Capacitación previa o breves sesiones de inducción.
- Proveer guías de uso, manuales y grabaciones.
- Soporte en tiempo real durante las pruebas.

7.6 Evaluación Continua de Riesgos

Durante toda la fase de aceptación se realizará un monitoreo continuo de riesgos para:

- Detectar oportunamente nuevos riesgos.
- Actualizar la severidad y probabilidad de los existentes.
- Asegurar la aplicación adecuada de las estrategias de mitigación.

Esta evaluación continua permite mantener controlado el proceso y garantizar un cierre exitoso de la aceptación del producto.

Plan de Aceptación para el Proyecto Pet's Ride

8. Cronograma

El cronograma del proceso de aceptación establece la planificación temporal de todas las actividades necesarias para validar y aprobar los entregables del proyecto *Pets's Ride*. Su propósito es asegurar que las actividades se realicen en el orden correcto, dentro del periodo establecido y con la disponibilidad adecuada de los recursos involucrados.

El cronograma considera los tiempos requeridos para la preparación, ejecución, análisis y formalización de resultados, permitiendo tener una visión integral del proceso y prever posibles desviaciones.

8.1 Estructura del Cronograma

El proceso de aceptación se divide en fases secuenciales que deben cumplirse para garantizar una validación exitosa. Las fases son:

- 1.- **Preparación del proceso y revisión documental.**
- 2.- **Configuración del entorno UAT.**
- 3.- **Ejecución de pruebas de aceptación.**
- 4.- **Registro de resultados y gestión de defectos.**
- 5.- **Corrección y verificación (retest).**
- 6.- **Elaboración del informe final.**
- 7.- **Aprobación formal y cierre.**

Cada fase contempla actividades específicas, responsables y un tiempo estimado de ejecución.

8.2 Cronograma Tentativo del Proceso

Fase	Actividad Principal	Responsable(s)	Duración Est.	Entregable / Hito
1. Preparación	• Validación de requisitos. • Selección de usuarios testers (Dueños de mascotas/Conductores). • Revisión de guiones de prueba.	Líder de QA / Product Owner	1-2 días	Plan de Pruebas Aprobado.
2. Configuración	• Despliegue de versión estable en ambiente UAT.	Equipo DevOps / Desarrollo	1 día	Ambiente UAT accesible y estable.

Plan de Aceptación para el Proyecto Pet's Ride

	• Creación de datos de prueba (Mascotas ficticias, rutas, pagos de prueba).			
3. Ejecución	• Realización de pruebas de flujo completo (Solicitud de viaje -> Finalización). • Pruebas de perfiles (Admin, Usuario, Conductor).	Usuarios Clave (UAT Testers)	3-5 días	Bitácora de ejecución al 100%.
4. Registro	• Documentación de incidencias en la herramienta de gestión. • Clasificación de defectos (Críticos, Altos, Medios).	Usuarios Clave / Soporte QA	Concurrente a Fase 3	Reporte preliminar de defectos.
5. Corrección (Retest)	• Solución de defectos Críticos y Altos. • Retest: Verificación de que los arreglos funcionan y no rompieron nada más.	Desarrollo / QA	2-4 días	Versión UAT Parcheada.
6. Informe Final	• Consolidación de métricas (Casos pasados vs. fallidos). • Redacción del acta de resultados.	Líder de Proyecto / QA	1 día	Informe de Resultados de UAT.
7. Aprobación	• Reunión de revisión de resultados (Go/No-Go). • Firma del acta de aceptación del software.	Stakeholders / Cliente	1 día	Acta de Aceptación Firmada.

8.3 Consideraciones del Cronograma

- El cronograma puede ajustarse según la complejidad de las funcionalidades evaluadas.
- Los retrasos en la resolución de defectos pueden extender las fases operativas.

Plan de Aceptación para el Proyecto Pet's Ride

- Las actividades críticas (UAT, corrección de defectos, aprobación) requieren disponibilidad obligatoria de los responsables.
- Se recomienda mantener reuniones breves de seguimiento diario para asegurar el cumplimiento de los plazos.

8.4 Representación Visual


El cronograma presenta la distribución temporal de las fases del UAT para el proyecto *Pets's Ride*. Este cronograma ha sido diseñado bajo una estrategia de ruta crítica, priorizando los tiempos de estabilización y corrección para asegurar la calidad del entregable final.

El ciclo de aceptación está programado para iniciar el martes 25 de noviembre de 2025 y concluir con la firma formal el viernes 12 de diciembre de 2025, abarcando un periodo total de 14 días hábiles.

Aspectos clave de esta planificación:

1. **Ejecución y Registro Paralelo:** Como se observa en la *Fase 3*, el "Registro de Defectos" se realiza de manera concurrente a la ejecución de pruebas. Esto permite al equipo de desarrollo tener visibilidad temprana de los hallazgos sin esperar a que finalicen todas las pruebas.
2. **Ruta Crítica (Bloques Rojos):** Las actividades de *Corrección de Bloqueantes* y *Retest QA* (Fase 4) se han marcado como críticas. Cualquier retraso en la resolución de estos defectos impactará directamente la fecha de la reunión "Go/No-Go".
3. **Hitos de Control (Rombos):** Se han establecido hitos de control al inicio del ambiente, al corte de pruebas y en la firma final para validar el cumplimiento de los criterios de entrada y salida de cada fase.

Nota de Gestión: Este cronograma asume una tasa de defectos dentro de los parámetros normales esperados. En caso de detectarse incidencias de severidad crítica que impidan el flujo principal de la aplicación (bloqueantes), la fase de Estabilización podría requerir iteraciones adicionales, lo cual se comunicaría formalmente a través del control de cambios.

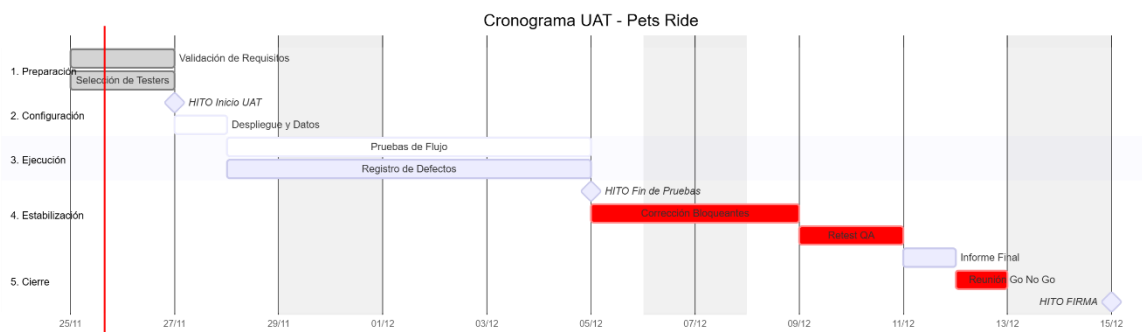

Plan de Aceptación para el Proyecto Pet's Ride

9. Aprobaciones

La aprobación formal del proceso de aceptación constituye el cierre oficial de la etapa de validación del proyecto *Pets's Ride*. A través de este procedimiento, se confirma que los entregables cumplen con los criterios previamente definidos, satisfacen los requerimientos del cliente y se encuentran en condiciones óptimas para su liberación y puesta en producción.

La aceptación será otorgada exclusivamente por los roles autorizados dentro del proyecto, quienes deberán revisar la documentación generada, los resultados de pruebas y cualquier evidencia asociada. La aprobación se formalizará mediante la firma del Acta de Aceptación Final y el registro correspondiente dentro del sistema de control de versiones o repositorio documental del proyecto.

9.1 Responsables de Aprobación

Los siguientes roles deberán otorgar su validación final:

- **Product Owner**

Responsable de verificar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos, así como con las necesidades del usuario final.

- **Líder Técnico**

Confirma que la solución ha sido implementada conforme a los estándares técnicos, lineamientos de arquitectura y criterios de calidad definidos.

- **Gerente de Proyecto**

Autoriza el cierre formal de la etapa de aceptación y garantiza que todos los entregables fueron completados satisfactoriamente según el cronograma y alcance definido.

- **Representante del Cliente o Usuario Clave**

Valida la experiencia funcional desde el punto de vista operativo y confirma que el producto es apto para uso real en el entorno previsto.

9.2 Proceso de Formalización

La aceptación final se realizará mediante los siguientes pasos:

- 1.- **Revisión de entregables del proceso de aceptación**, incluyendo reportes de pruebas, matrices de criterios, bitácoras de incidencias y evidencias visuales.
- 2.- **Reunión de cierre de aceptación**, donde se presentarán los resultados finales, se resolverán dudas y se confirmará la inexistencia de incidencias críticas pendientes.
- 3.- **Firma del Acta de Aceptación Final**, en formato físico o digital, conforme a los lineamientos del proyecto.

Plan de Aceptación para el Proyecto Pet's Ride

- 4.- **Registro de la aprobación** en el repositorio definido (Git), dejando constancia auditada.
- 5.- **Autorización de liberación a producción**, en caso de que aplique, por parte del área técnica correspondiente.

9.3 Criterios para Aprobar el Proyecto

La aprobación solo podrá emitirse si se cumplen los siguientes puntos:

- Todos los criterios de aceptación funcional y no funcional fueron validados positivamente.
- Las incidencias clasificadas como críticas o mayores se encuentran resueltas y reprobadas.
- Las incidencias menores cuentan con un plan de corrección documentado y aprobado.
- El desempeño, estabilidad y seguridad del sistema cumplen los umbrales establecidos.
- El cliente manifiesta conformidad con la solución y su usabilidad.
- Los entregables están completos, actualizados y correctamente almacenados.
