


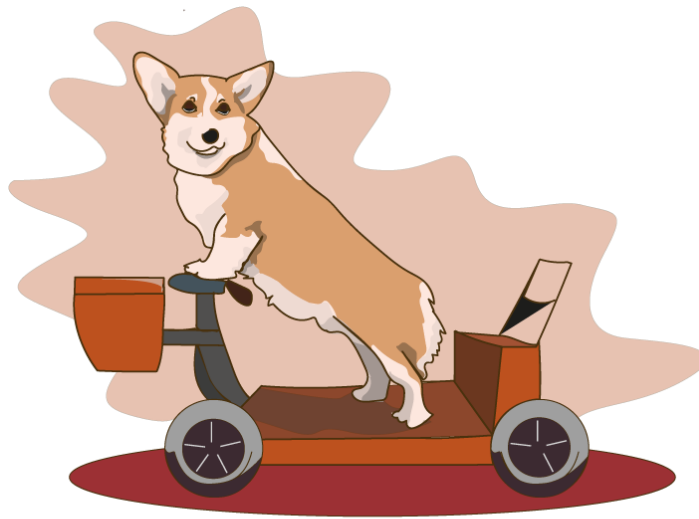

PET'S RIDE

Plan de Gestión de los Recursos Humanos para el proyecto:

Pet's Ride

Elaborado por:

Canche Tintore Jorge Armando
Cetzal Ceme Bryan Emmanuel
Lagunez Rodríguez Luis Manuel
Tejero Gamboa Leticia del Carmen
Turriza Euan Andrés de Jesús

Versión: 1.3

Fecha: 20 de octubre de 2025

Plan de Gestión de los Recursos Humanos

Tabla de Contenido

1.	Resumen Ejecutivo	4
2.	Descripción del Plan de Gestión de los Recursos Humanos	4
2.1	Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos	4
2.2	Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.....	5
2.3	Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.....	5
2.4	Clasificación de los involucrados	6
3.	Organización del Plan de Gestión de los Recursos Humanos	7
3.1	Organigrama (Esquema)	7
3.2	Roles y Responsabilidades	7
4.	Estructura detallada de trabajo	8
5.	Administración de los Recursos Humanos	9
5.1	Competencias requeridas para el equipo	9
5.2	Capacitación o adquisición.....	10
5.3	Estrategia para el trabajo en equipo.....	10
5.4	Estrategia para adquirir el equipo de trabajo.....	11
5.5	Calendario de recursos.....	11
5.5.1	Horarios	11
5.5.2	Criterios de liberación.....	12
5.6	Desarrollo del equipo de trabajo	13
5.6.1	Capacitación	13
5.6.2	Evaluación del desempeño	13
5.7	Dirección del equipo de trabajo.....	13
5.7.1	Solicitud de cambio de integrantes de equipo	13

6.	Políticas Operatorias	13
6.1	Normas de comunicación	13
6.2	Políticas de desempeño y conducta	13
6.2.1	Conducta Esperada del Equipo.....	13
6.2.2	Clasificación de Faltas y Sanciones.....	14
6.2.3	Proceso disciplinario gradual	15
6.3	Seguridad y confidencialidad	15
6.4	Protocolos de cambio y sustitución de personal	16

1. Resumen Ejecutivo

El Plan de Gestión de Recursos Humanos (PGRH) de *Pet's Ride* tiene como objetivo principal identificar y documentar los roles, responsabilidades y estructuras del equipo de proyecto. Este plan es crucial para asegurar que el desarrollo de la plataforma web cuente con talento altamente capacitado, necesario para centralizar y optimizar la conexión entre dueños y proveedores de servicios para mascotas, cumpliendo con los estándares de calidad y ética de la empresa.

2. Descripción del Plan de Gestión de los Recursos Humanos

2.1 Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos

El Plan de Gestión de Recursos Humanos (PGRH) de *Pet's Ride* se desarrolla para garantizar que el equipo humano del proyecto sea el activo más competente y alineado con los valores de la empresa.

Visión: Construir y mantener un equipo de proyecto altamente competente, motivado y alineado con los valores de *Pet's Ride*, que garantice la ejecución exitosa y sostenible del proyecto a través de una gestión del talento transparente y eficaz.

Requerimientos: El desarrollo de la Aplicación requiere de roles altamente especializados en desarrollo FullStack, diseño UX/UI y liderazgo visionario. Este plan es necesario para:

1. Documentar las responsabilidades y la jerarquía de un equipo de alto rendimiento.
2. Definir la figura del Administrador del Sistema encargado de la verificación de datos y soporte.

Beneficios Esperados:

- Garantizar que el personal cumpla con las políticas de honestidad, calidad y valores fundamentales de *Pet's Ride*.
- Minimizar conflictos y optimizar el rendimiento del personal, mediante la definición clara de roles y responsabilidades.
- Facilitar la contratación eficaz del personal de back office (Administrador del Sistema).

Estrategia: El PGRH se desarrollará mediante la definición de los perfiles necesarios, la documentación de las políticas de integridad y ética, y el establecimiento de mecanismos de evaluación y sanción para asegurar el cumplimiento de las metas del proyecto.

2.2 Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos

Establecer la estructura de equipo, definir los perfiles y documentar las políticas operativas y de adquisición de personal para asegurar la entrega de la plataforma web *Pet's Ride* en un plazo determinado.

2.3 Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos

Establecer la estructura del equipo, definir los perfiles y documentar las políticas operativas y de adquisición de personal para asegurar la entrega de la Aplicación en un plazo determinado.

Componente	Declaración
Entregas	Documento de Roles y Responsabilidades Organigrama del Proyecto; Matriz de Competencias Requeridas y Política de Sanciones y Recompensas
Exclusiones	No incluye la gestión de la nómina o la administración de las prestaciones, las cuales son responsabilidad del Patrocinador (Inversiones PetTech S.A.).
Restricciones	El equipo de desarrollo inicial (<i>Kitten's Team</i>) es interno.
Supuestos	Se asume que el personal clave (CEO, Gerentes, Desarrollador, Diseñador) posee las competencias técnicas requeridas. Se asume la aprobación financiera del Patrocinador para la contratación del Administrador del Sistema
Factores críticos del Éxito	Mantener una comunicación eficaz entre todos los miembros del equipo. Garantizar que el equipo mantenga la integridad y ética en el manejo de datos confidenciales.


2.4 Clasificación de los involucrados

El Plan de Gestión de Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de interesados.

Rol en el proyecto	Interesado	Intereses
Patrocinador	Inversiones PetTech S.A.	Maximizar el retorno de inversión y garantizar la viabilidad financiera.
Administrador del proyecto / CEO	Leticia del Carmen Tejero Gamboa	Mantener adecuada comunicación entre stakeholders y el equipo de desarrollo del proyecto para cumplir con los requerimientos necesarios y la búsqueda de proveedores para asegurar el correcto despliegue de la aplicación en el sector comercial.
Gerente de proyecto/ Gerente de oficina de proyectos	Luis Manuel Lagunez Rodríguez	Supervisión del cumplimiento de plazos y de la ejecución del trabajo.
Equipo de desarrollo	Bryan Emmanuel Cetzal Ceme	Desarrollar la plataforma con altos estándares de Calidad y tecnología.
Gerente de marketing	Andrés de Jesús Turriza Euan	Implementación exitosa de las estrategias de captación y retención de usuarios.
Cliente/ Usuario final	Dueños de Mascotas	Recibir un servicio confiable y eficiente para el cuidado de sus mascotas.
Administrador del sistema	Rol de soporte a contratar	Gestión operativa diaria y verificación de proveedores

3. Organización del Plan de Gestión de los Recursos Humanos

3.1 Organigrama (Esquema)

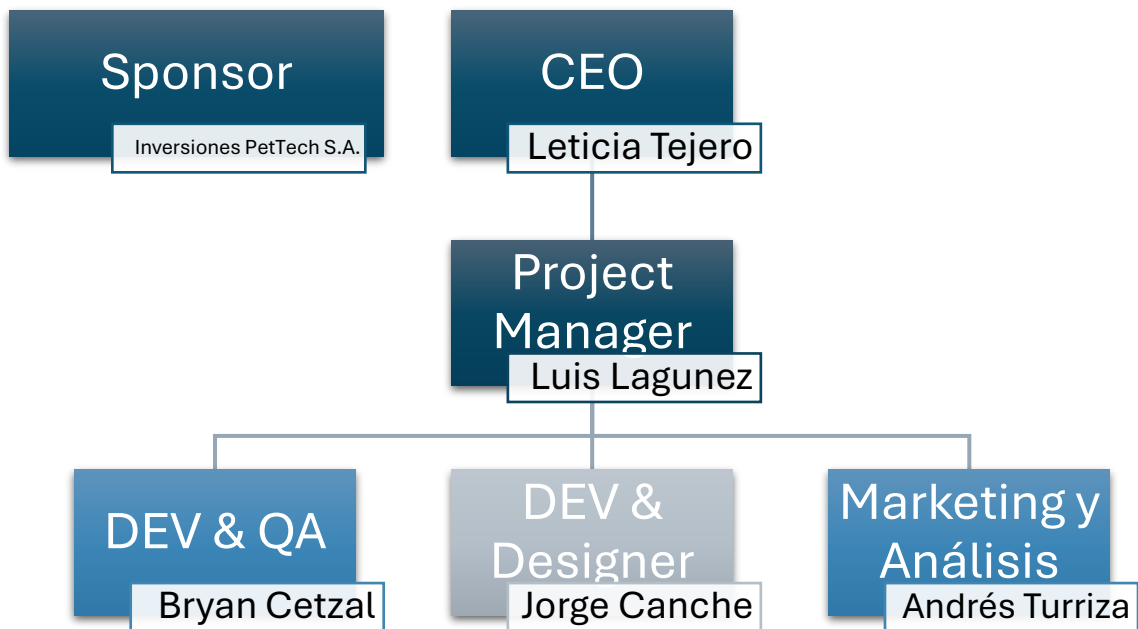

3.2 Roles y Responsabilidades

Rol	Involucrado (Nombre)	Responsabilidad clave (Cada requisito)
Patrocinador	Inversiones PetTech S.A.	• Aprobación del Acta. • Autorización del presupuesto. • Garantizar la infraestructura.
CEO	Leticia del Carmen Tejero Gamboa	• Supervisar la dirección general del proyecto. • Validar los objetivos estratégicos y aprobar los entregables finales.

Administrador del proyecto	Luis Manuel Lagunez Rodríguez	• Planificar, coordinar y supervisar el desarrollo del proyecto. • Administrar recursos, cronograma y riesgos. • Aprobar liberaciones parciales y finales del personal.
Desarrollador FullStack y Diseñador UX/UI	Jorge Armando Canche T.	• Diseñar la interfaz de usuario y desarrollar funcionalidades FrontEnd y BackEnd. • Asegurar la usabilidad y la coherencia visual del sistema.
Desarrollador FullStack y Analista de QA	Bryan Emmanuel Cetzal Ceme	• Implementar módulos del sistema. • Ejecutar pruebas de calidad y garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos y funcionales.
Gerente de marketing y Analista de datos	Andrés de Jesús Turriza Euan	• Diseñar estrategias de posicionamiento. • Analizar métricas de mercado y comportamiento de usuarios. • Proponer mejoras basadas en datos.

4. Estructura detallada de trabajo

4.1. Estructura detallada de trabajo

Para el desarrollo de la Aplicación de *Pet's Ride*, el proyecto seguirá una metodología ágil y se dividirá en las siguientes fases o macro actividades principales:

Fase	Descripción general de la actividad
1. Análisis	Identificación de requerimientos y generación del SRS (Especificación de Requisitos del Software).
2. Diseño	Creación de la arquitectura del sistema y diseño de UI/UX.
3. Desarrollo	Programación FullStack de la Aplicación.
4. Pruebas	Evaluación funcional y de seguridad para asegurar calidad. Se incluye la

	elaboración del Plan de Pruebas de Aceptación.
5. Implementación	Despliegue de la plataforma en un entorno de producción (lanzamiento oficial).
6. Mantenimiento	Monitoreo y resolución de incidencias post lanzamiento.
7. Evaluación y Optimización	Análisis de métricas y mejoras continuas.

5. Administración de los Recursos Humanos

5.1 Competencias requeridas para el equipo

Rol	Competencias (Conocimientos/Habilidades)	Autoridad clave
Administrador del proyecto	• Liderazgo visionario. • Comunicación eficaz. • Toma de decisiones. • Conocimiento del negocio.	• Definir cronogramas y fechas de entregables. • Negociar el cambio de personal.
Desarrollador FullStack	• Desarrollo y mantenimiento de infraestructura backend y frontend. • Bases de datos y APIs.	• Ejecución técnica de las tareas asignadas.
Diseñador UX/UI	• Diseño y optimización de interfaces y experiencia de usuario.	• Definir las pautas de diseño y elementos gráficos de la plataforma.
Administrador del sistema	• Habilidades de soporte. • Verificación de identidad. • Manejo de finanzas.	• Modificar privilegios y publicar contenido informativo.
Gerente de marketing	• Conocimiento en SEO. • Gestión de redes sociales. • Análisis de métricas de captación de usuarios. • Estrategias de posicionamiento de marca.	• Aprobar campañas de publicidad. • Gestionar el presupuesto de marketing asignado.

5.2 Capacitación o adquisición

El equipo interno (*Kitten's Team*) se considera altamente capacitado. La capacitación se enfocará en:

- **Proceso de capacitación para nuevo personal (Onboarding):** Todo nuevo integrante seguirá un proceso de incorporación estructurado.
 1. **Sesión de bienvenida y cultura empresarial:** Presentación de la misión, visión y valores de *Pet's Ride*, así como del equipo de trabajo, el flujo de trabajo y explicación de sus responsabilidades.
 2. **Asignación de mentor:** Se le asignará un miembro del equipo como punto de contacto para resolver dudas durante las primeras semanas.
 3. **Capacitación técnica y de Procesos:** Formación específica sobre las herramientas que usará para el cumplimiento de sus responsabilidades, protocolos de comunicación y las responsabilidades de su rol.
 4. **Revisión a 30 días:** Una reunión con el administrador del proyecto para evaluar la adaptación, resolver dudas y establecer objetivos.
- **Capacitación continua:** Se promoverá el desarrollo profesional mediante seminarios web mensuales con expertos y el acceso a recursos educativos relevantes para el sector.

5.3 Estrategia para el trabajo en equipo

La estrategia para el trabajo en equipo en *Pet's Ride* se fundamenta en la creación de un entorno laboral ético, colaborativo y orientado a resultados, donde prevalezcan la transparencia, el respeto mutuo y el compromiso profesional. La empresa promueve una cultura basada en la **confianza, responsabilidad compartida y comunicación efectiva**, buscando que cada integrante aporte al cumplimiento de los objetivos comunes con integridad y empatía.

La ética laboral constituye un eje esencial en la gestión del talento: se fomenta el cumplimiento de normas, la equidad en la toma de decisiones y la confidencialidad en el manejo de información. Se rechazan prácticas de discriminación, favoritismo o competencia desleal entre colaboradores.

En *Pet's Ride*, se promueve que cada empleado refleje los valores corporativos en sus acciones diarias. Los valores y principios que guían la forma de trabajo son los siguientes:

- **Integridad:** Actuar con honestidad y transparencia en cada decisión y acción, fortaleciendo la confianza dentro y fuera del equipo.
- **Respeto y equidad:** Asegurar la igualdad de oportunidades y el trato justo para todos los empleados. Fomentar el respeto para disfrutar el entorno laboral.

- **Ética y honestidad:** Brindar total transparencia de las acciones. Se exige la integridad y ética del liderazgo. El cumplimiento de normativas de protección de datos personales es crucial.
- **Trabajo en equipo:** Se establecerán reuniones quincenales para revisar avances y se utilizarán herramientas de gestión para coordinar tareas.
- **Colaboración:** Impulsar el trabajo conjunto y la comunicación constante entre las áreas de desarrollo, diseño, marketing y dirección.
- **Innovación:** Fomentar la creatividad y la búsqueda de soluciones tecnológicas que generen valor para los usuarios y la empresa.

Con esta estrategia, *Pet's Ride* asegura un ambiente de trabajo donde prevalece la ética profesional, el respeto y la coordinación entre los miembros del equipo, elementos clave para alcanzar los objetivos del proyecto.

5.4 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo

Proceso de Contratación de Personal Externo para roles específicos, se seguirá el siguiente proceso:

1. **Publicación de la vacante:** Se definirán los requisitos y se publicará la oferta en plataformas profesionales.
2. **Revisión curricular:** Selección de candidatos que cumplan con el perfil técnico y de experiencia.
3. **Entrevista técnica:** Evaluación de habilidades y conocimientos específicos para el rol.
4. **Entrevista psicológica:** Entrevista con el Administrador del Proyecto para evaluar la alineación con los valores de la empresa.
5. **Oferta formal:** Presentación de la oferta económica y contractual al candidato seleccionado.

5.5 Calendario de recursos

5.5.1 Horarios

El equipo de trabajo operará bajo un horario de **Lunes a Viernes**, con una jornada de 8 horas diarias, y **sábado**, con una jornada de 4 horas, equivalente a **44 horas semanales**. Cada integrante podrá organizar su jornada de forma flexible (si la organización o las tareas lo permiten), siempre que se garantice el cumplimiento de los objetivos y plazos establecidos dentro de los 6 meses de ejecución.

Se establecerán **reuniones quincenales de seguimiento** (presenciales o virtuales) y la **entrega de reportes mensuales de avance**.

En caso de requerirse reuniones extraordinarias, se programarán con al menos 12 horas de anticipación.

5.5.2 Criterios de liberación

- **Liberación por finalización de fase:** El personal será liberado cuando su fase de trabajo haya concluido y el entregable sea aprobado por el Administrador del Proyecto.
- **Liberación parcial:** En caso de que ciertos roles o tareas específicas concluyan antes del cierre general de la fase, el Administrador del Proyecto podrá autorizar la liberación anticipada del recurso, previa verificación de cumplimiento de los objetivos asignados.
- **Liberación total:** Todo el personal será liberado formalmente al cierre del proyecto, una vez emitido el informe final de aceptación y cumplidos los compromisos administrativos correspondientes.
- **Proceso de desvinculación (Offboarding):** Cuando un empleado deje de trabajar en la empresa, ya sea por **renuncia voluntaria** o **terminación de contrato por parte de la organización**, se seguirá el siguiente proceso:

1. Notificación formal:

- En caso de renuncia, el empleado deberá notificar su salida por escrito con al menos 15 días de anticipación.
- En caso de terminación de contrato, el área administrativa o el administrador del proyecto notificará formalmente al empleado, indicando las razones y condiciones de la desvinculación.

2. Plan de transición:

Se activará el protocolo de Transferencia de Conocimiento, que incluye la documentación de tareas, entrega de pendientes y una sesión de traspaso con el reemplazo o con el Administrador de Proyecto.

3. Devolución de activos:

El empleado deberá devolver todos los equipos, credenciales y materiales propiedad de la empresa o del proyecto.

4. Entrevista de salida:

Se realizará una entrevista con el área de Recursos Humanos o el Administrador de Proyecto para obtener retroalimentación y registrar observaciones sobre su desempeño y experiencia.

5. Baja administrativa:

Se procederá con los trámites legales, de nómina y documentación necesarios para formalizar la desvinculación, asegurando el cumplimiento de las políticas laborales vigentes.

6. Eliminación de cuentas y accesos:

Por protocolo de seguridad las cuentas vinculadas al personal que se han retirado de la empresa, así como accesos serán destruidas o inhabilitadas para preservar la integridad de la información y materiales de la empresa.

5.6 Desarrollo del equipo de trabajo

5.6.1 Capacitación

[\[Sección 5.2\]](#)

5.6.2 Evaluación del desempeño

- **Evaluación y recompensa:** Se realizará un sistema de monitoreo y análisis de datos para evaluar el desempeño de la aplicación y por extensión, del equipo que la desarrolla.
- **Castigos/Sanciones:** [Detalle en la sección [6.2](#) y [5.7.1](#)]

5.7 Dirección del equipo de trabajo

5.7.1 Solicitud de cambio de integrantes de equipo

El Administrador del Proyecto tiene la autoridad para negociar el cambio de personal en caso de ser necesario. Los procedimientos para solicitar un cambio (sustitución por bajo desempeño o infracción grave) serán canalizados a través del Administrador del Proyecto para la aprobación final.

6. Políticas Operatorias

6.1 Normas de comunicación

- **Frecuencia:** Reuniones quincenales obligatorias con stakeholders para revisar avances.
- **Medios:** Uso de herramientas de gestión para monitorear tareas. Se enviarán reportes mensuales con métricas clave del desarrollo.
- **Liderazgo:** Se espera comunicación efectiva por parte de todo el equipo para el correcto flujo de información.

6.2 Políticas de desempeño y conducta

6.2.1 Conducta Esperada del Equipo

Se espera que todos los miembros del equipo *Pet's Ride* adhieran su conducta a los valores fundamentales de la organización:

- **Calidad y compromiso:** Cada miembro es responsable de la excelencia técnica de sus entregables y de cumplir con los plazos acordados en las reuniones quincenales.
- **Honestidad e integridad:** Se requiere transparencia total en la comunicación. Cualquier riesgo o retraso debe ser comunicado al Administrador.

- **Equidad y respeto:** Se debe mantener un entorno de trabajo colaborativo, profesional, libre de acoso y discriminación, asegurando un trato justo para todos.

6.2.2 Clasificación de Faltas y Sanciones

Las faltas cometidas por el personal se clasifican en **leves, moderadas y graves**, según su impacto en el cumplimiento de los objetivos del proyecto, la convivencia del equipo y la seguridad de la información.

Faltas leves:

Conductas que afectan la dinámica del equipo, pero no comprometen directamente la continuidad del proyecto.

- Entregar tareas o reportes fuera del plazo acordado, sin justificación válida, de forma ocasional.
- Ausentarse de reuniones o actividades programadas sin notificación previa ni justificación válida (máximo una vez en un periodo de dos meses).
- Descuidar la calidad mínima en documentación, comunicación interna o seguimiento de procesos establecidos.
- Uso inadecuado de canales de comunicación (por ejemplo, mensajes fuera de horario laboral sin urgencia, lenguaje poco profesional).

Sanciones aplicables:

1. Amonestación verbal que será documentada.
2. Amonestación por escrito si la conducta se repite.
3. Inclusión en un plan de mejora del desempeño.

Faltas moderadas:

Conductas que, sin ser graves, muestran un patrón de incumplimiento o afectan de manera más notoria la dinámica del equipo.

- Reincidencia en faltas leves (por ejemplo, más de dos ausencias sin aviso en un trimestre).
- Retrasos frecuentes que afectan dependencias de otros integrantes.
- Falta de colaboración o resistencia reiterada a lineamientos técnicos u organizativos.

Sanciones aplicables:

1. Amonestación escrita inmediata.
2. Inclusión obligatoria en plan de mejora.
3. Evaluación de continuidad en el equipo si no hay avances.

Faltas graves:

Conductas que comprometen la integridad del proyecto, la seguridad de la información o la convivencia del equipo.

- Reiterado incumplimiento de responsabilidades críticas asignadas.
- Actitudes irrespetuosas, discriminatorias, de acoso o violencia hacia compañeros.
- Divulgación de información confidencial, manipulación indebida de datos o uso no autorizado de recursos del proyecto.
- Negligencia técnica que afecte la integridad del proyecto, la seguridad de la información o la reputación institucional.

Sanciones aplicables:

1. Amonestación escrita inmediata.
2. Implementación obligatoria de plan de mejora con seguimiento estricto.
3. Suspensión temporal o solicitud de reemplazo del integrante, según determine el Administrador del Proyecto con aprobación del CEO y el patrocinador.

6.2.3 Proceso disciplinario gradual

1. **Amonestación verbal documentada:**

Para infracciones leves, como el incumplimiento inicial de plazos o procesos documentados. Quedará registrada por el Administrador del Proyecto.

2. **Amonestación por escrito:**

Para infracciones leves reiteradas o faltas de conducta esperada.

3. **Plan de mejora de desempeño:**

En caso de persistir el bajo desempeño, se establecerá un plan formal con objetivos y plazos definidos.

4. **Suspensión o solicitud de cambio:**

Como se indica en la política, aplica para infracciones graves (Violación del Código de Ética, confidencialidad) o el fracaso del plan de mejora.

6.3 Seguridad y confidencialidad

- **Ética:** Estricta prohibición de divulgación de información confidencial. El proyecto debe cumplir con la **protección de datos personales** (como la Ley Federal de Protección de Datos en México).
- **Técnica:** Los datos sensibles deben estar **cifrados** y el sistema debe cumplir con los estándares de seguridad (como la normativa PCI DSS para pagos).

6.4 Protocolos de cambio y sustitución de personal

El protocolo es liderado por la Administración del Proyecto:

1. **Detección de necesidad:** El administrador del Proyecto detecta la necesidad de cambio (por bajo desempeño, renuncia o liberación de fase).
2. **Documentación:** Se documenta los procedimientos que se van a utilizar para hacer una **solicitud de cambio de un integrante del equipo de proyecto.**
3. **Transferencia de conocimiento:** Previo a la liberación de un integrante (ya sea por finalización de fase o por sustitución), este deberá completar una Transferencia de Conocimiento que incluya la documentación detallada de su trabajo y una sesión de traspaso con su reemplazo o con el Administrador del Proyecto. La aprobación de esta transferencia será un requisito indispensable para su liberación.
4. **Aprobación:** El administrador del proyecto negocia y aprueba la sustitución, y el Patrocinador ratifica.
